




MEJORA PAVIMENTACIÓN

ILUMINACIÓN

ACCESIBILIDAD

CAMPUS BURJASSOT

08 OCTUBRE DE 2025



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
Servei Tècnic i de Manteniment





FOTOS VIAL RECEPCIONADO.

Zonas en actuación:

Recepción parcial:

Facultad de Biología y la
Facultad de Matemáticas.
Abierta a los usuarios.

01- octubre 2025

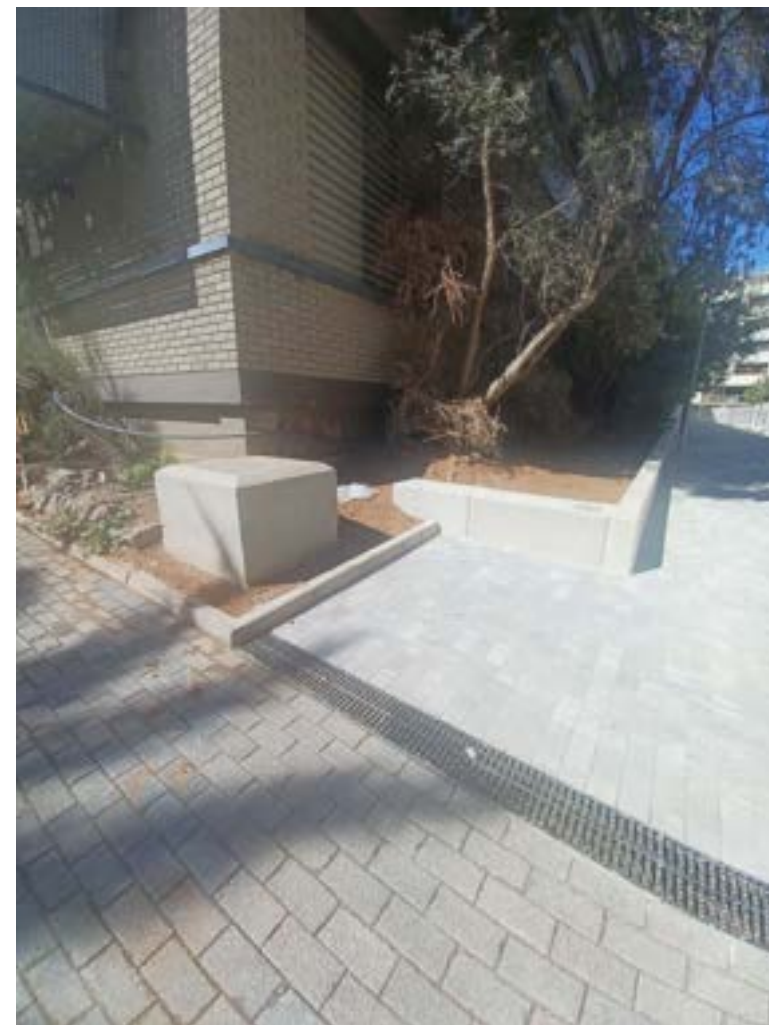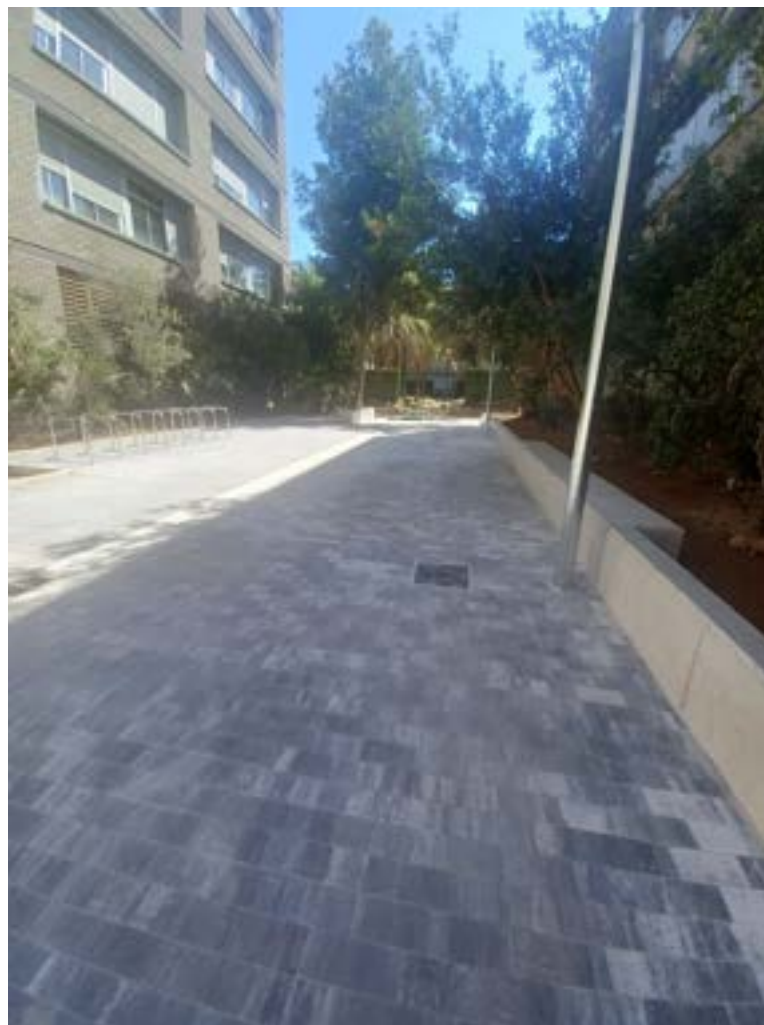



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
Servei Tècnic i de Manteniment



valnu
Servicios de ingeniería

DOC
diseño y ejecución de construcción

2nd Mitad de Septiembre
Final de Octubre



CAMPUS BURJASSOT



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
Servei Tècnic i de Manteniment



PLANO ORGANIZACIÓN OBRA FASE 1B


Zonas en actuación:

Medios Viales:

Químicas, Física y Biología

Acera exterior del Jeroni Muñoz

FINALIZACIÓN FINALES DE OCTUBRE

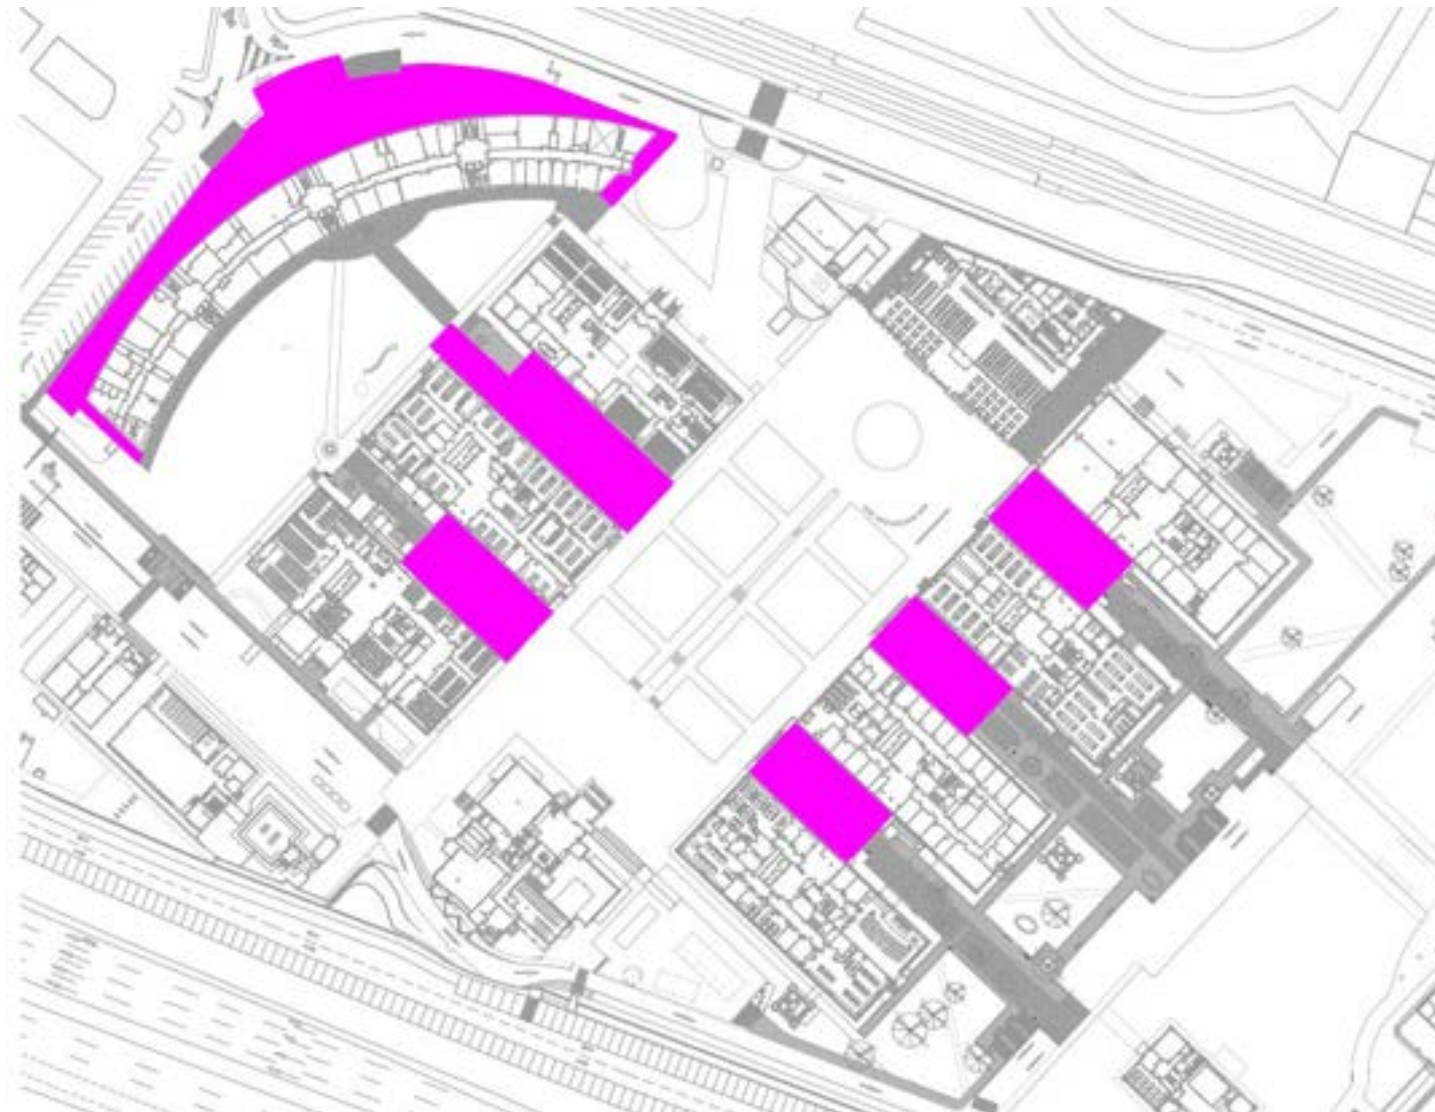



UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
Servei Tècnic i de Manteniment



PLANO ORGANIZACIÓN OBRA FASE 1C

Inicio de trabajo:

Principios de Noviembre:

- Pasillo de Química
- Pasillo de Química-Física
- Pasillo de Físicas
- Rampa de Matemáticas

Principios de Diciembre:

- Pasillo de Biología.

Finales de Diciembre:

- Acera interior Jeroni Muñoz



PON

